


Öffentlicher Projektreport Oktober 2017

Projektdaten:

7.902 m Autobahn A 33 ca. 1.900 m Zubringer Schnatweg	Autobahnquerschnitt: SQ 27
20 Brücken	Autobahnanschlussstellen: ▪ Steinhagen (Bielefelder Straße), Nr. 18 ▪ Künsebeck (Schnatweg), Nr. 17
4 Regenrückhaltebecken	ca. 200 ha Ausgleichsflächen
ca. 26.000 m ² Lärmschutzwände	ca. 10 km Lärmschutzwälle
Gesamtkosten 123,422 Mio. € (genehmigt 27.01.2017)	Grunderwerb: 17,028 Mio. € Baukosten: 106,394 Mio. €

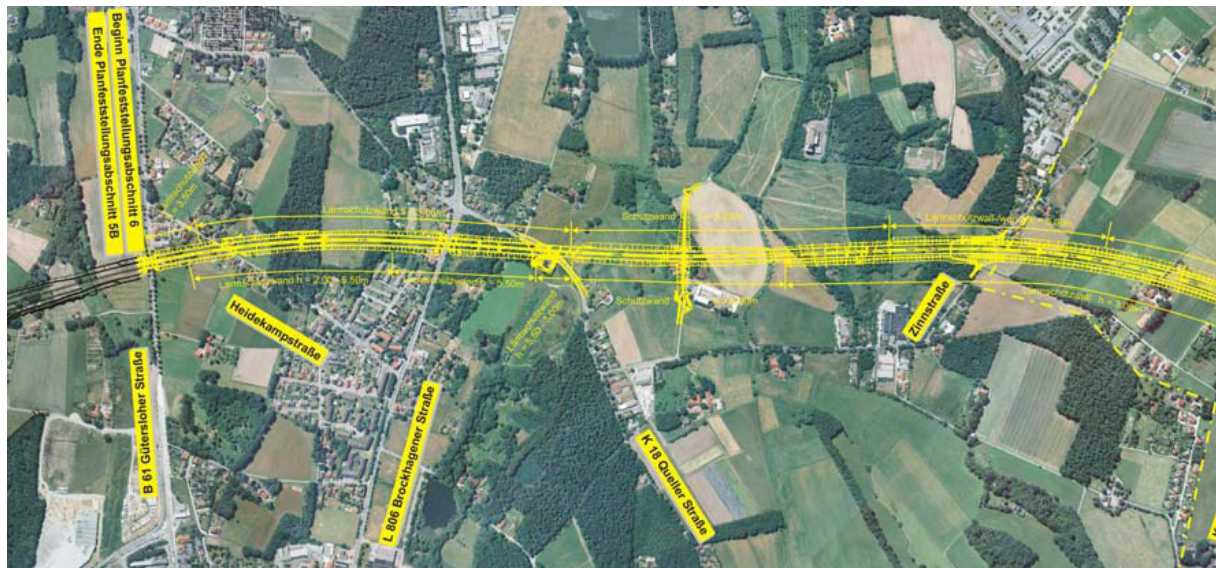

Übersichtskarte

Meilensteine:

Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Detmold	06.06.2007
Vollziehbarkeit des Beschlusses durch Entscheidung BVerwG Leipzig	12.08.2009
1. Spatenstich:	25.09.2009

Projektstand Oktober 2017:

Fertig gestellt: (Fertigstellung)

- Bauwerk 601 Gütersloher Straße (B 61) (12/2011)
- Bauwerk 602 Heidekampstraße (12/2014)
- Bauwerk 603 Brockhagener Straße (L806) (09/2013)
- Bauwerk 604 Queller Straße (K 18) (09/2014)
- Bauwerk 605 Wirtschaftsweg "Auf der Höhe" (04/2012)
- Bauwerk 606 Lichtebach (08/2014)
- Bauwerk 608 Zinnstraße (04/2012)
- Bauwerk 611 Queller Straße (K 31) (10/2014)
- Bauwerk 616 Lange Straße (10/2013)
- Bauwerk 617 Viehtrift (Lange Straße) (10/2013)
- Bauwerk 618 Viehtrift / Cronsholbach (09/2014)
- Bauwerk 620 Bielefelder Straße (L 778) (04/2012)
- Bauwerk 621 Pulverbach (08/2014)
- Bauwerk 623 Bahnhofstraße (L791) (03/2011)
- Bauwerk 624 Jücker Mühlenbach (11/2014)
- Bauwerk 626 Upheider Weg (10/2013)
- Bauwerk 629 Foddenbach (12/2011)
- Bauwerk 631 Flurstraße/Hilterweg (05/2013)
- Überführungsrampe Bahnhofstraße (L 791) (05/2012)
- Überführungsrampe Bielefelder Straße (L 778) (08/2013)
- Überführungsrampe "Lange Straße" (06/2014)
- Überführungsrampe "Upheider Weg" (06/2014)
- Ausbau Zubringer "Schnatweg" (10/2014)
- Regenrückhaltebecken 2 (Bielefelder Straße) (09/2014)
- Regenrückhaltebecken 3 (Bahnhofstraße) (09/2014)
- Regenrückhaltebecken 4 (Schnatweg) (10/2014)
- Herstellung von Blänken und Bachrenaturierungen (05/2015)
- Bauwerk 627 Gewässer-/Amphibiendurchlass (10/2015)
- Bauwerk 612 Gewässer-/Amphibiendurchlass (12/2015)
- Überführungsrampe Queller Straße (K 31) (12/2015)
- 1. Bauabschnitt Streckenbau (04/2017)
Schnatweg - Queller Straße (K 31)
- 2. Bauabschnitt Streckenbau (04/2017)
Gütersloher Straße (B 61) - Queller Straße (K 31)
 - Regenrückhaltebecken 1 (Queller Straße, K 18)

Laufendes Baugeschehen: (geplante Fertigstellung)

- | | |
|--|-----------------|
| • Betonschutzwände | 4. Quartal 2017 |
| • Lichtsignalanlage für AS 18 "Steinhagen" | 4. Quartal 2017 |
| • Lärmschutzwände von der B 61 bis zum Schnatweg | 4. Quartal 2017 |
| • Wegweisende Beschilderung (Schilderbrücken) | 4. Quartal 2017 |
| • Fernmeldeanlagen / Notrufsäulen | 4. Quartal 2017 |
| • Stahlschutzeinrichtungen | 4. Quartal 2017 |
| • Markierungsarbeiten | 4. Quartal 2017 |
| • Beschilderungen im nachgeordneten Netz | 4. Quartal 2017 |

Im Jahr 2016 wurden Baumittel in Höhe von 24,3 Mio. € umgesetzt.
Bis Ende 2016 wurden damit Baumittel in Höhe von 86,2 Mio. € investiert.
Im Jahr 2017 sind Bauausgaben in Höhe von rd. 16,5 Mio. € vorgesehen.

Der erforderliche Grunderwerb erfolgte im Rahmen eines Unternehmensflurbereinigungsverfahrens (Durchführung: Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - der Bezirksregierung Detmold als Untere Flurbereinigungsbehörde).
